MHC Mola · Kiosk

Üretim paftaları: şasi · sandviç panel · köşe modülü · çıta · Alucobond · cam · asma kat



Malzeme ve renkler

Eleman	Tarif
Sandviç panel (duvar)	60 mm PIR, dış RAL 7016 antrasit, iç RAL 9010 beyaz
Sandviç panel (çatı)	60 mm PIR trapez, RAL 7016, %1,5 eğim
Köşe modülü	0,8 mm galvaniz bükme sac RAL 7016 + 50 mm taşyünü + iç sac RAL 9010
Cephe çıtası	40×28 mm termo ahşap (ceviz tonu) veya ahşap görünümlü alüminyum
Karkas	45×22 mm siyah alüminyum omega
Alucobond	4 mm kompozit, mat siyah (#1F1D1C), PVDF boya
Doğrama	siyah RAL 9005 alüminyum, 6 mm temperli cam
Logo / tabela	krem kanal harf (arkadan LED) + Ø720 çift taraflı daire çıkma tabela

Ana ölçüler

Dış ölçü (çıta yüzü)	5000 × 3000
Saçak dahil	5036 × 3036
Toplam yükseklik	3000
Köşe yarıçapı	R450
Net iç yükseklik	2340
Teknik asma kat (klima)	+2500 … +2840
Pencere boşluğu	3600 × 1170
Kapı boşluğu (net)	900 × 2040

Genel notlar

1. Tüm ölçüler mm'dir. Kotlar şasi alt yüzüne (±0) göredir; bitmiş iç döşeme +160.
2. Çelik profiller öneridir. Statik hesap, kaynak ve bağlantı detayları yetkili mühendis onayıyla kesinleşir.
3. Tüm çelik imalat sıcak daldırma galvaniz veya epoksi astar + RAL 7016 boya ile korunur.
4. Köşeler R450 mm (dış çıta yüzü). Düz yüzler sandviç panel, köşeler kavisli köşe modülüdür (KM).
5. Parça numaraları: D dikme · P panel · KM köşe modülü · K Alucobond kaset · Ç çıta.
6. Panel ve kaset ölçüleri imalattan önce kurulmuş şasi üzerinde yerinde ölçülerek teyit edilir.
7. Montaj sırası 03 numaralı paftadadır. Asma kat ve klima, çatı paneli kapanmadan yerleştirilir.
8. Elektrik, su ve gider tesisatı bu setin kapsamı dışındadır; yalnızca geçiş yerleri gösterilmiştir.
9. Logo (MHC Mola): ön ve sol bantta krem kanal harf, sol yanda çift taraflı Ø720 daire çıkma tabela (pafta 11).

Pafta listesi

No	Pafta	Ölçek
00	Kapak ve genel notlar	
01	Genel görünüşler ve plan	1:40
02	Kesit A-A ve duvar detayları	1:20 · 1:5 · 1:10
03	Montaj sırası	
04	Çelik şasi ve taşıyıcı sistem	1:30 · 1:50
05	Yuvarlak köşe detayı (köşe modülü KM)	1:5 · 1:20
06	Sandviç panel ve köşe modülü açınımı	1:40
07	Çıta ve karkas açınımı	1:40
08	Alucobond kaset, süpürgelik ve kaplamalar	1:40 · 1:5
09	Pencere, servis kapağı, ekran ve kapı	1:20
10	Teknik asma kat ve klima yerleşimi	1:25 · 1:15
11	Çatı, logo, daire tabela ve toplam metraj	1:50 · 1:20 · 1:10

MHC Mola · Kiosk

5.0 × 3.0 × 3.0 m · prefabrik kahve kioskusu


Kapak ve genel notlar

Tüm ölçüler mm'dir. Ölçüler sahada kontrol edilmeden imalata başlanmaz.

PAFTA 00


ÖLÇEK —

TARİH 28.10.2026

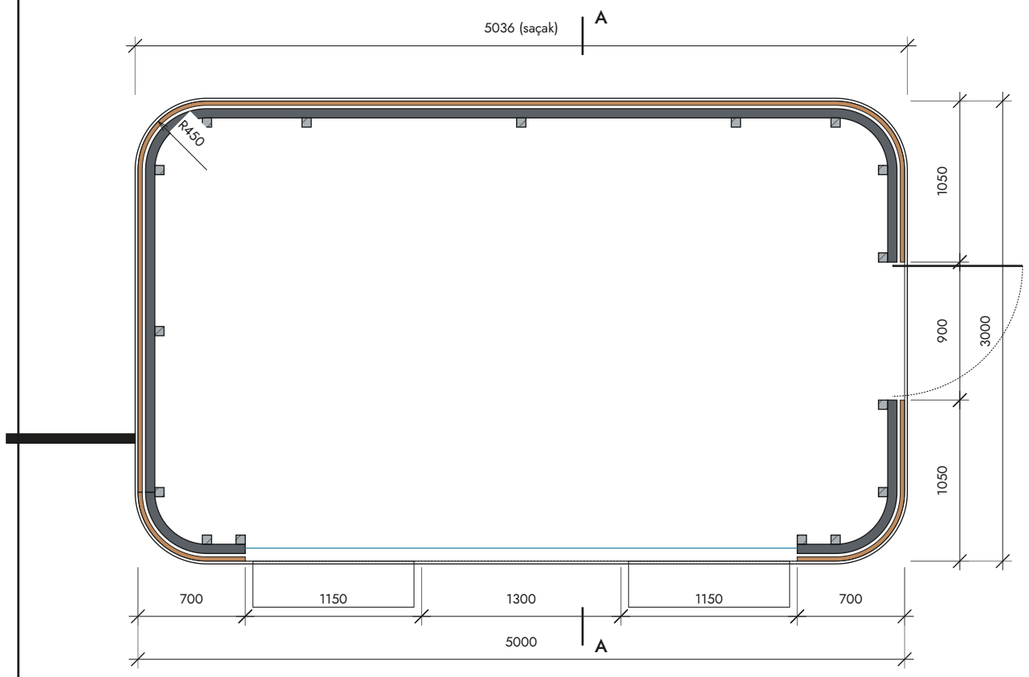


PLAN (+1,50 kesiti)

Ölçek 1:40

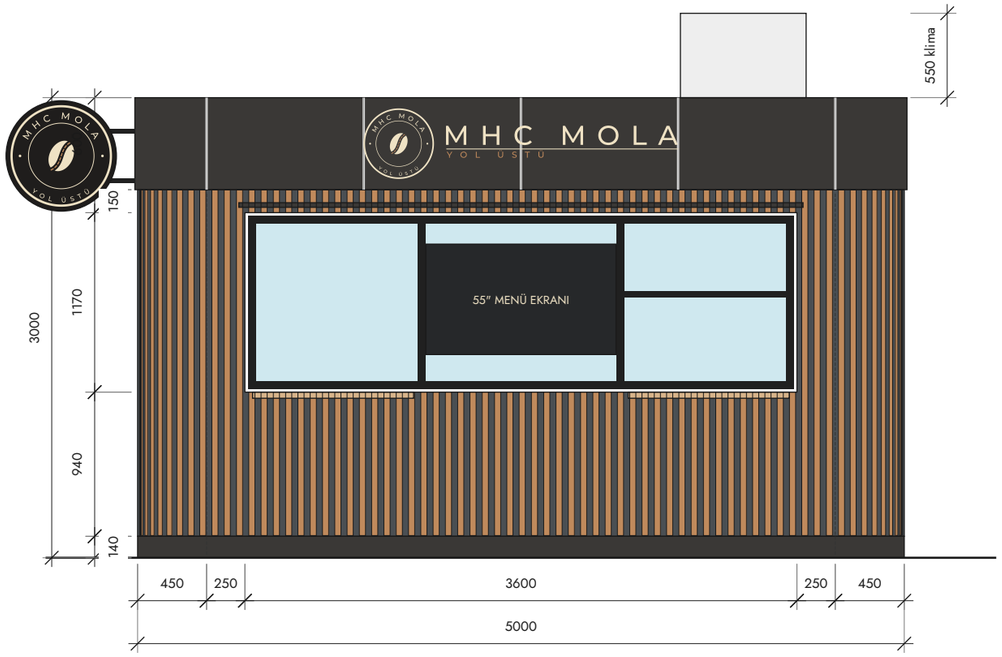


ÖN GÖRÜNÜŞ (servis cephesi)

Ölçek 1:40

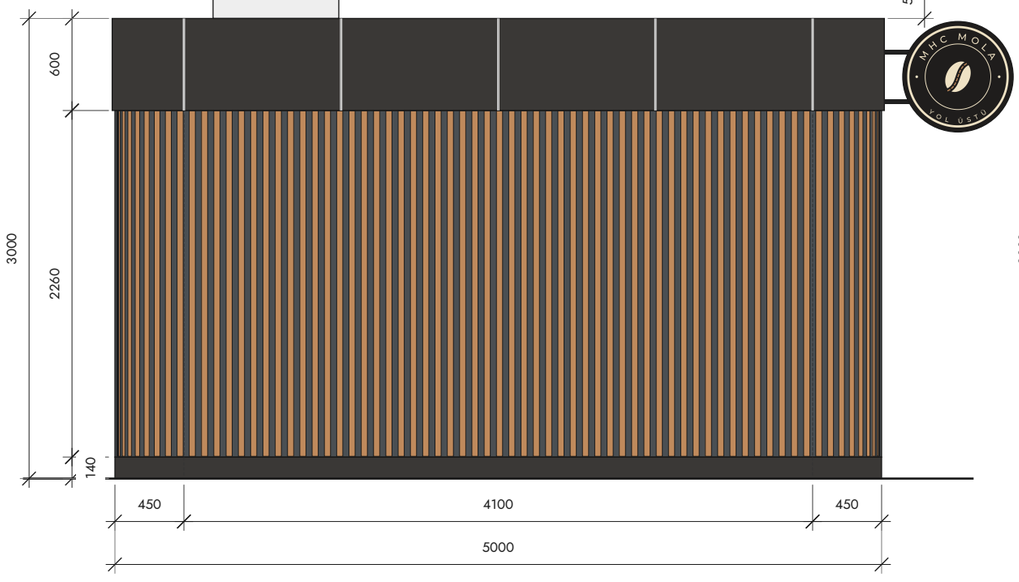

ARKA GÖRÜNÜŞ

Ölçek 1:40

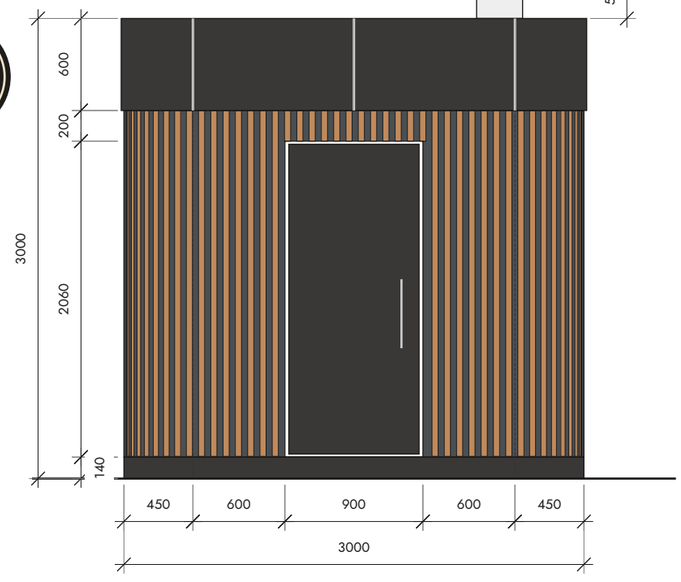

SAĞ GÖRÜNÜŞ (kapı)

Ölçek 1:40



SOL GÖRÜNÜŞ

Ölçek 1:40

MHC Mola · Kiosk

5.0 × 3.0 × 3.0 m · prefabrik kahve kioskusu


Genel görünüşler ve plan

Tüm ölçüler mm'dir. Ölçüler sahada kontrol edilmeden imalata başlanmaz.


PAFTA 01

ÖLÇEK 1:40


TARİH 28.10.2026

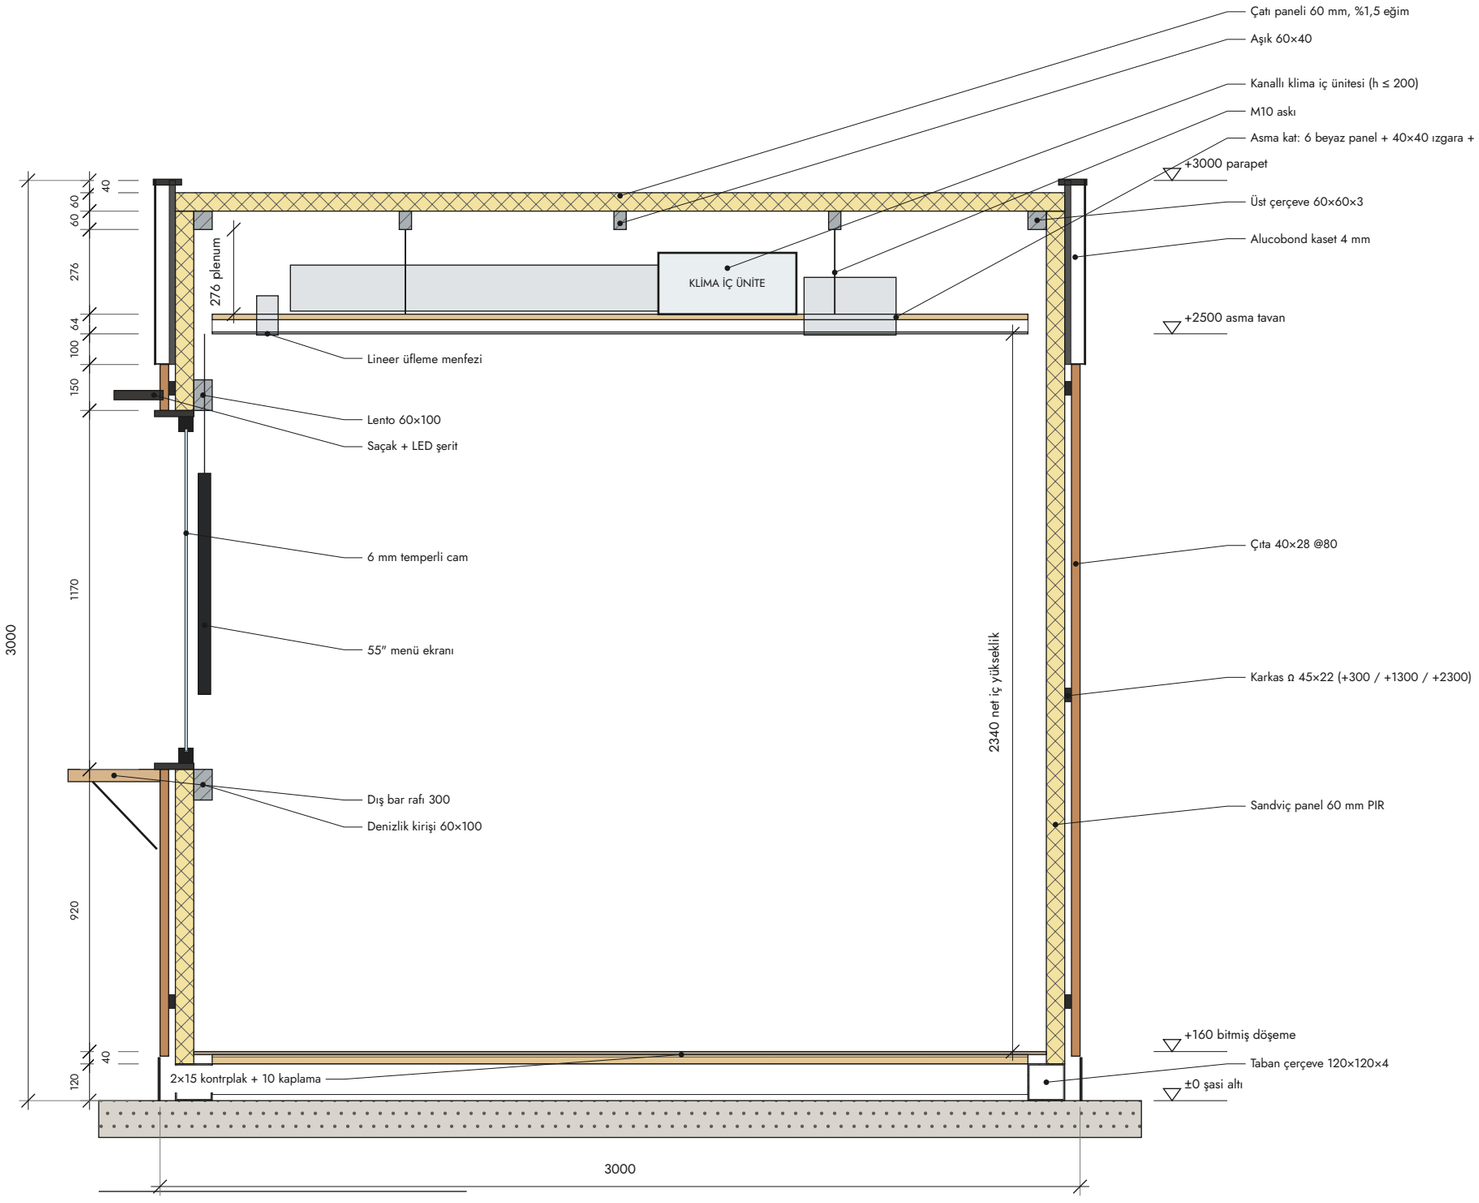

KESİT A-A (ekran gözü ve klima ekseninden, x = +400)
Ölçek 1:20

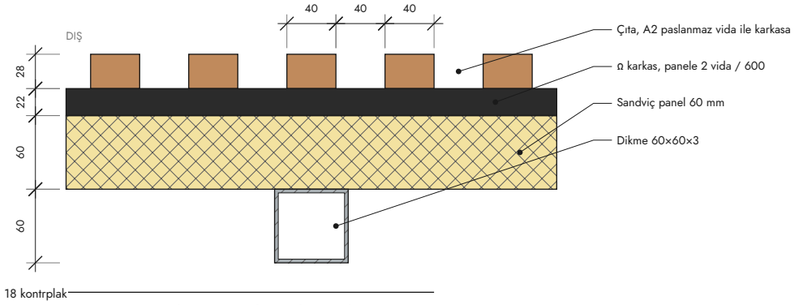

DETAY 1 · Düz duvar yatay kesiti (+1300)
Ölçek 1:5

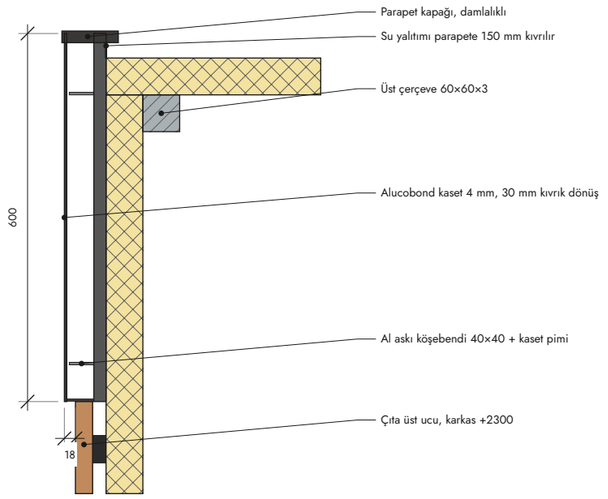

DETAY 2 · Saçak ve parapet düşey kesiti
Ölçek 1:10


MHC Mola · Kiosk

5.0 × 3.0 × 3.0 m · prefabrik kahve kioskusu

Kesit A-A ve duvar detayları


Tüm ölçüler mm'dir. Ölçüler sahada kontrol edilmeden imalata başlanmaz.

PAFTA	02
ÖLÇEK	1:20 · 1:5 · 1:10
TARİH	28.10.2026

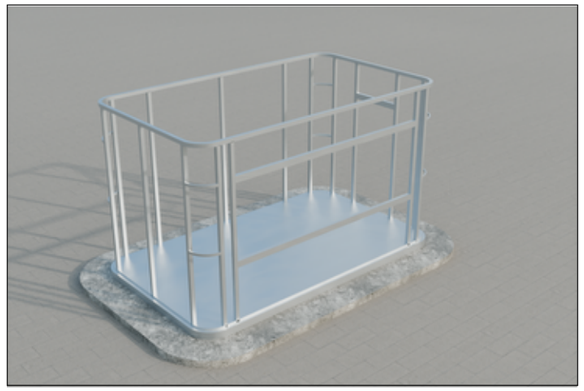


1 · Şasi

Taban çerçeve 120×120×4 (köşeler hadde bükümlü) ve 5 ara kiriş kaynatılır. 16 dikme (D01–D16), lento, denizlik, köşe kaburgaları ve üst çerçeve kurulur. Köşegen farkı ≤ 3 mm.

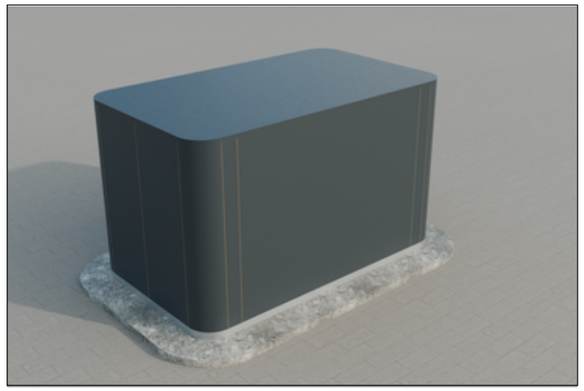

2 · Sandviç panel + çatı

Düz yüzlere 60 mm paneller (P01–P12), köşelere kavisli köşe modülleri (KM1–KM4). Çatı paneli %1,5 eğimle kapanır (önce 7. adımdaki asma kat iskeleti asılır).

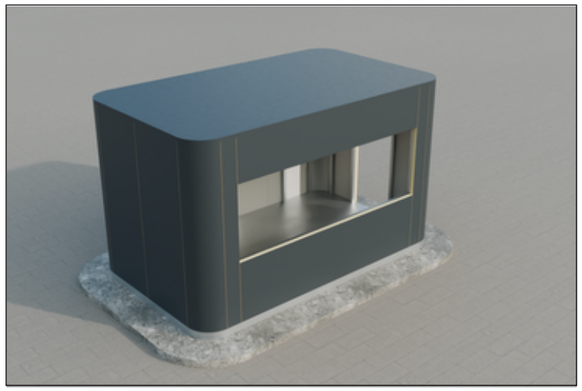

3 · Boşluklar

Pencere 3600×1170 ve kapı 900×2060 boşlukları lento/denizlik hizasından kesilir; kesik panel kenarları söve kaplamasıyla kapanır (pafta 09).




4 · Karkas ve çıta

Süpürgelik, siyah Ω karkas (+300 / +1300 / +2300), ardından 190 adet 40×28 çıta, ~80 mm aksla, ön-sol köşeden başlayarak vidalanır (pafta 07).



5 · Alucobond saçak

Saçak bandına 16 kaset (K01–K16) askı profillerine asılır, derz 8 mm, parapet kapağı takılır (pafta 08). Kanal harf logo ve daire tabela takılır (pafta 11).

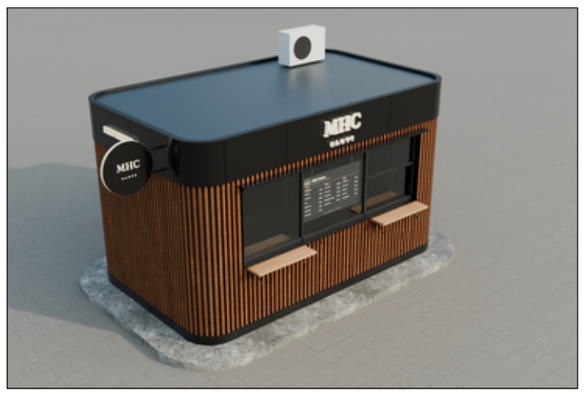

6 · Cam, ekran, kapı

Siyah doğrama, 6 mm temperli camlar, sürgülü servis kapağı, 55″ menü ekranı, kapı, pencere saçağı (LED) ve bar rafları monte edilir (pafta 09).



7 · Teknik asma kat + klima

+2500'de asma kat ızgarası M10 askılarla aşıklara asılır; kontrplak, kanallı klima iç ünitesi, menfezler, bakım kapağı (pafta 10).



8 · Teslim

Tesisat, iç mobilya ve ekipman yerleşimi sonrası son kontroller: su testi (çatı), LED ve ekran, kapı/servis kapağı ayarları.

MHC Mola · Kiosk

5.0 × 3.0 × 3.0 m · prefabrik kahve kioskusu


Montaj sırası

Tüm ölçüler mm'dir. Ölçüler sahada kontrol edilmeden imalata başlanmaz.

PAFTA
03

ÖLÇEK
–

TARİH
28.10.2026

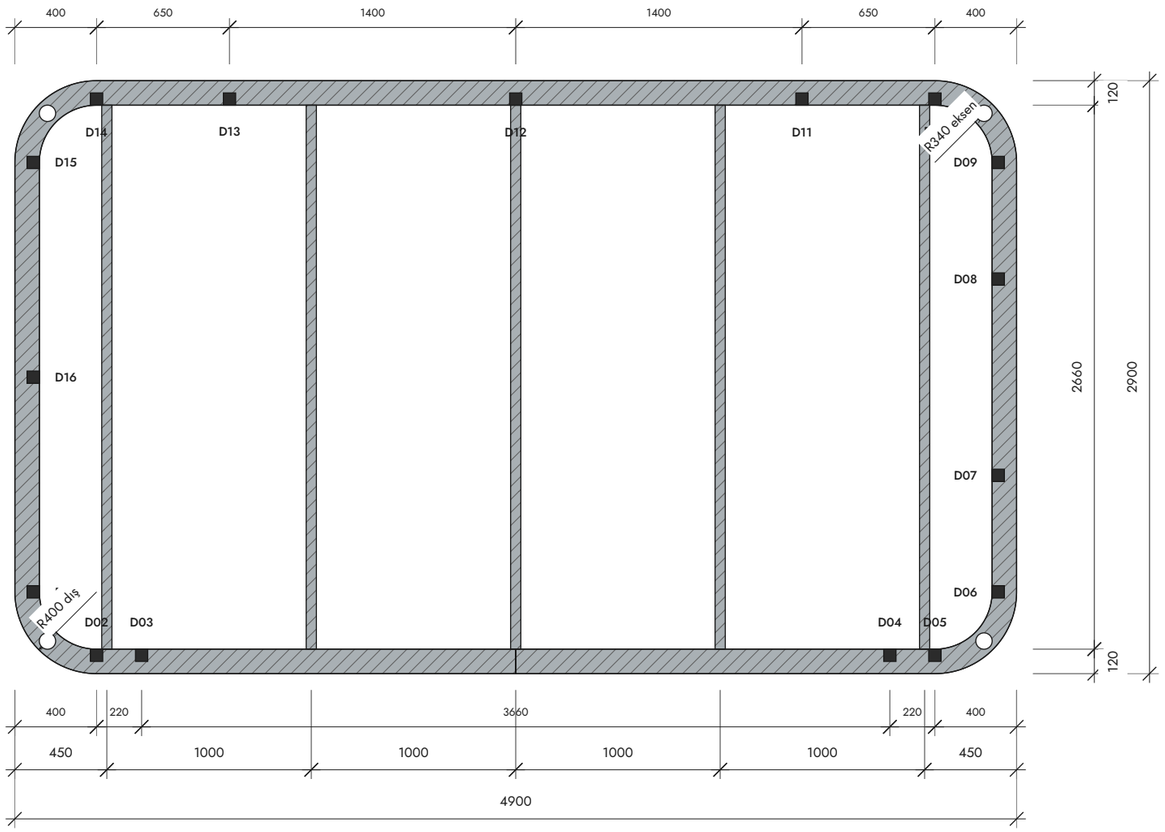


Poz	Eleman	Profil	Boy	Adet	Top. m
T1	Taban çerçeve, ön/arka düz	120×120×4	4100	2	8.20
T2	Taban çerçeve, yan düz	120×120×4	2100	2	4.20
T3	Taban çerçeve köşe yayı R340 eksen	120×120×4	534	4	2.14
T4	Taban ara kiriş	100×50×3	2660	5	13.30
D	Dikme D01–D16	60×60×3	2720	16	43.52
L1	Pencere lentosu	60×100×3	3600	1	3.60
L2	Pencere denizlik kirişi	60×100×3	3600	1	3.60
L3	Kapı lentosu	60×100×3	900	1	0.90
K	Köşe kaburgası R330 eksen (+1300, +2300)	40×20×2	518	8	4.15
Ü1	Üst çerçeve, ön/arka düz	60×60×3	4100	2	8.20
Ü2	Üst çerçeve, yan düz	60×60×3	2100	2	4.20
Ü3	Üst çerçeve köşe yayı R310 eksen	60×60×3	487	4	1.95
A	Çatı aşığı (y = −700 / 0 / +700)	60×40×2	4660	3	13.98
M1	Asma kat taşıyıcı	40×40×2	2660	5	13.30
M2	Asma kat çevre köşebendi	L40×40×4	14159	1	14.16
M3	Asma kat askısı	M10 dişli + L40	276	10	2.76

Profil toplamları (fire hariç)

Profil	Toplam m
120×120×4	14.5
100×50×3	13.3
60×60×3	57.9
60×100×3	8.1
40×20×2	4.1
60×40×2	14.0
40×40×2	13.3
L40×40×4	14.2
M10 dişli + L40	2.8


ŞASİ PLANI (taban çerçeve, kirişler, dikmeler)

Ölçek 1:30

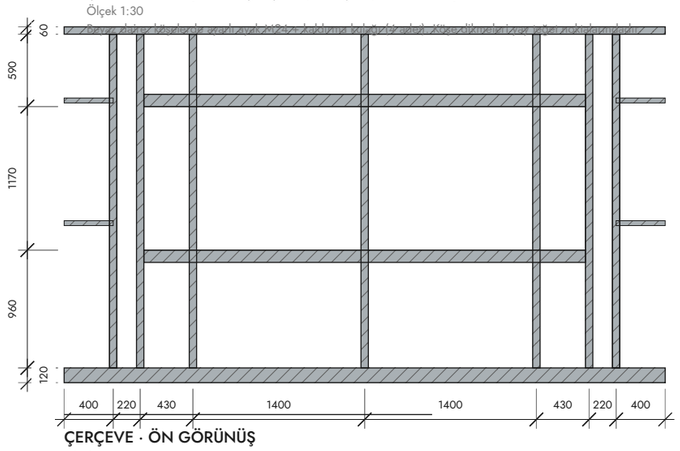

ÇERÇEVE · ÖN GÖRÜNÜŞ

Ölçek 1:50

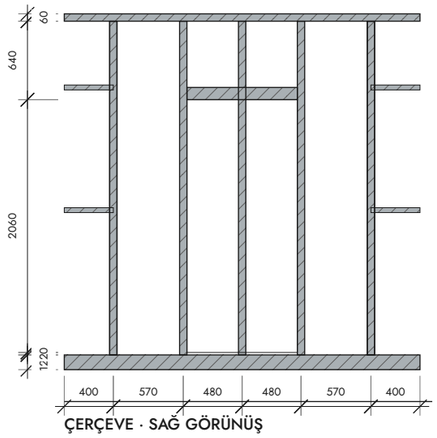

ÇERÇEVE · SAĞ GÖRÜNÜŞ

Ölçek 1:50

MHC Mola · Kiosk

5.0 × 3.0 × 3.0 m · prefabrik kahve kioskusu

Çelik şasi ve taşıyıcı sistem

Tüm ölçüler mm'dir. Ölçüler sahada kontrol edilmeden imalata başlanmaz.

PAFTA 04

ÖLÇEK 1:30 · 1:50


TARİH 28.10.2026

Köşe modülü (KM) imalatı


- Yay: dış sac R400 · iç sac R340 · 90°
- Dış sac açınımı ≈ 628 + 2×50 bindirme, h = 2780
- İç sac açınımı ≈ 534 + 2×50 bindirme
- Sac: 0,8 mm galvaniz, dış RAL 7016 / iç RAL 9010, silindir bükümlü
- Dolgu: 50 mm taşyünü (yoğunluk ≥ 100 kg/m³), boşluk kalmayacak
- Saclar kaburgalara ve teğet dikmelere 4,8 mm matkap uçlu vida @200
- Panel–KM birleşimi: dikme üzerinde, iç ve dış köşe lambası + mastik

Çıta ve karkas köşede

- Çıta aksı yay üzerinde de ~80 mm, çıtalar radyal
- Ω karkas R422 hadde bükümlü veya 100 mm parçalı
- Köşedeki görünen yay boyu (çıta dışı) 707

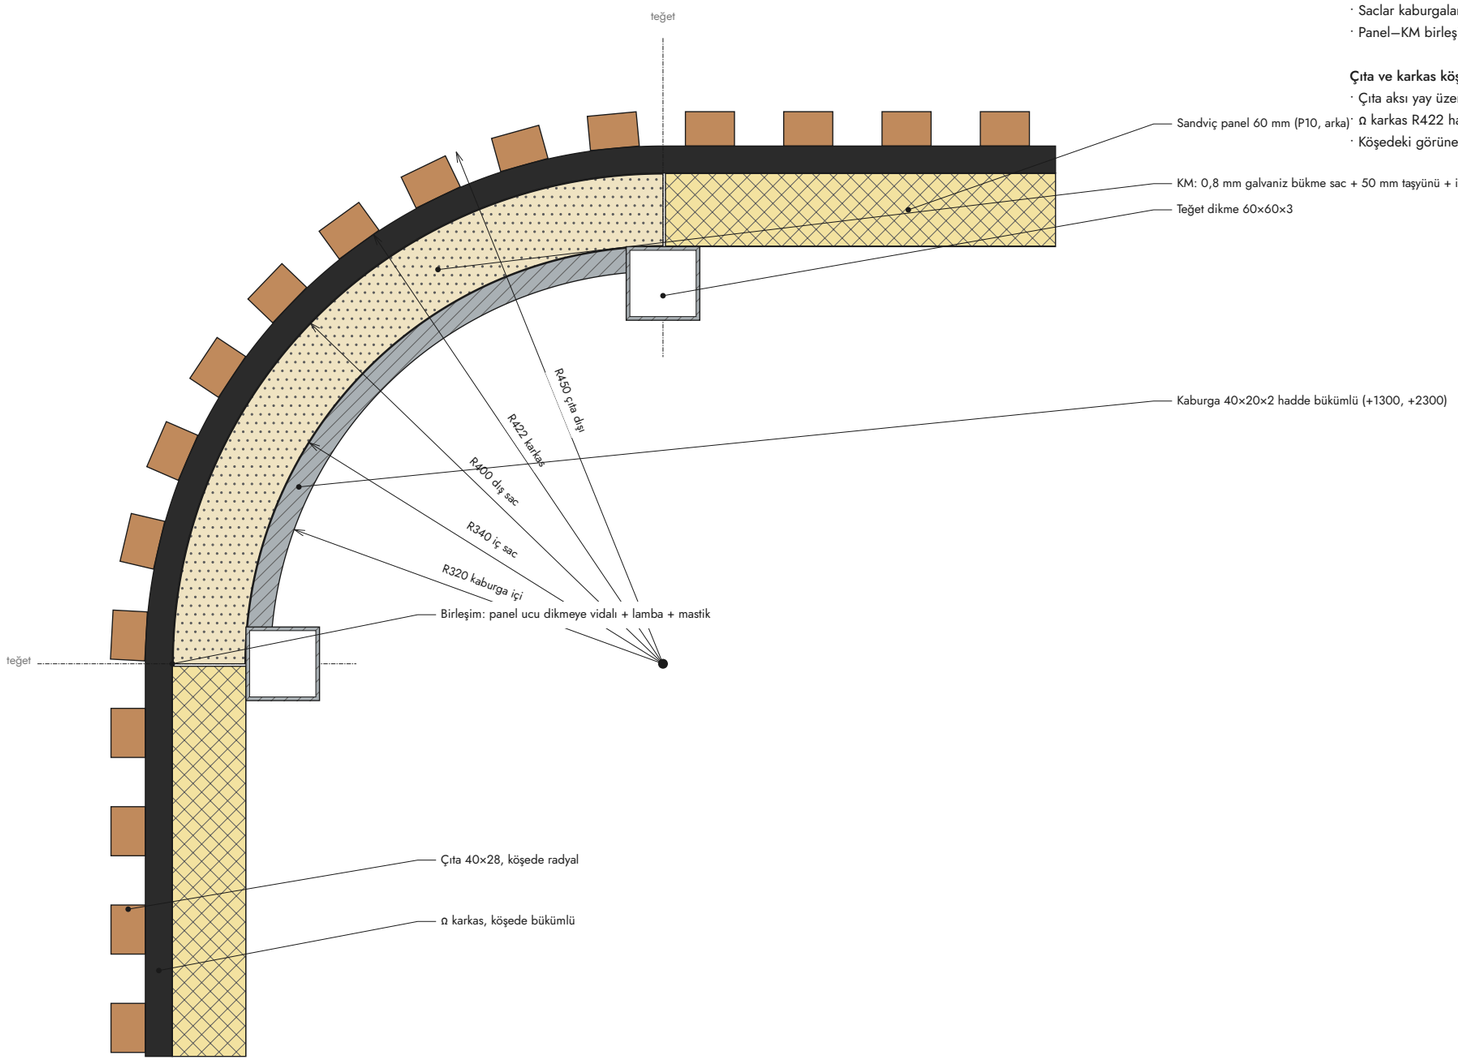

KÖŞE PLAN KESİTİ +1300 (arka-sol köşe, 4 köşe aynı)
Ölçek 1:5

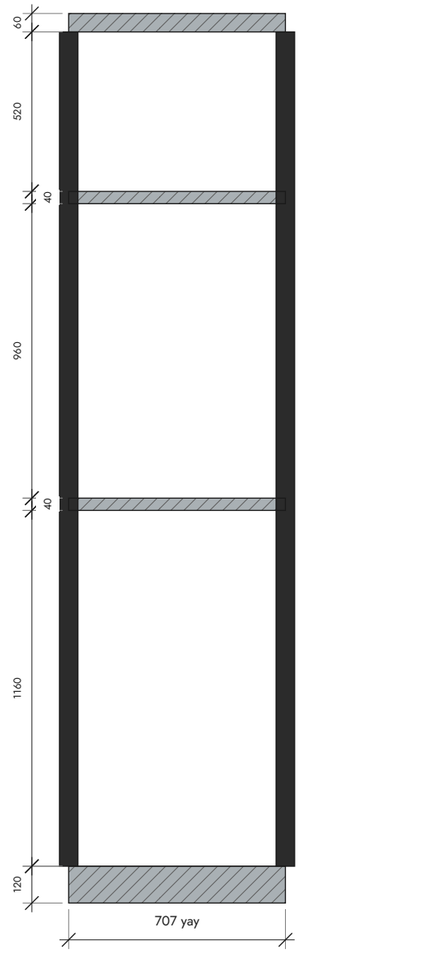

KÖŞE İSKELETİ (açılmış)
Ölçek 1:20

MHC Mola · Kiosk

5.0 × 3.0 × 3.0 m · prefabrik kahve kioskusu


Yuvarlak köşe detayı (köşe modülü KM)

Tüm ölçüler mm'dir. Ölçüler sahada kontrol edilmeden imalata başlanmaz.

PAFTA 05

ÖLÇEK 1:5 · 1:20

TARİH 28.10.2026

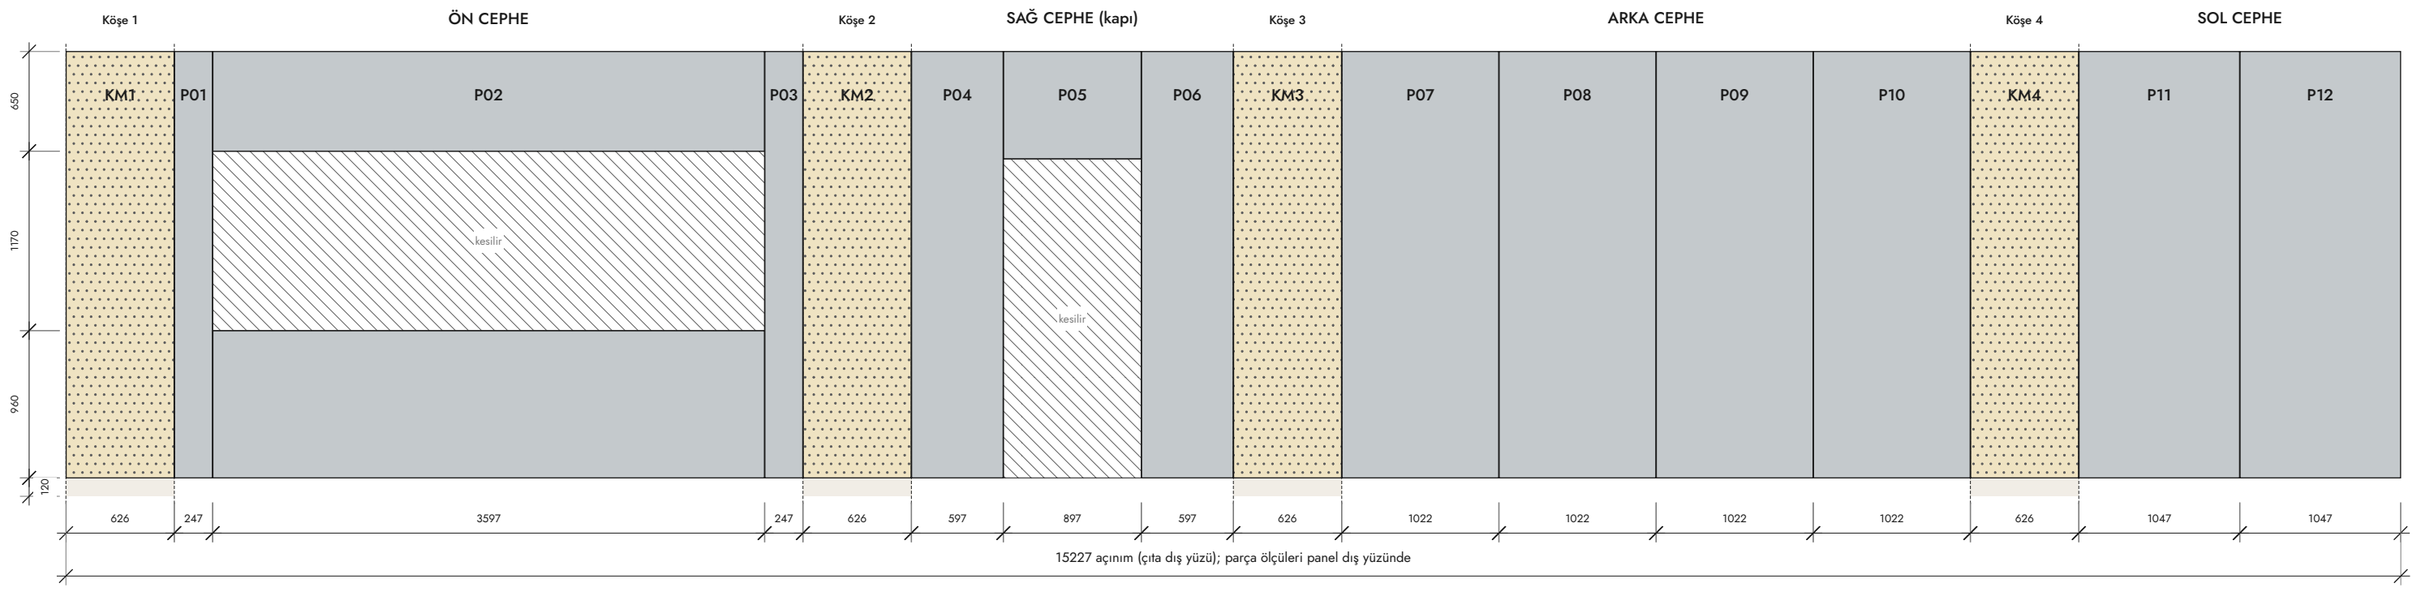

DUVAR AÇINIMI · dışarıdan bakış, ön-sol köşeden saat yönü tersine

Ölçek 1:40

No	Cephe	Tip	Ölçü G × Y (mm)	Not
KM1	Köşe	kavisli KM	626×2780	iç sac 532
P01	Ön cephe	düz panel	247×2780	
P02	Ön cephe	düz panel	3597×960 + 3597×650	pencere gözü: yatay 2 parça
P03	Ön cephe	düz panel	247×2780	
KM2	Köşe	kavisli KM	626×2780	iç sac 532
P04	Sağ cephe (kapı)	düz panel	597×2780	
P05	Sağ cephe (kapı)	düz panel	897×700	kapı üstü parça
P06	Sağ cephe (kapı)	düz panel	597×2780	
KM3	Köşe	kavisli KM	626×2780	iç sac 532
P07	Arka cephe	düz panel	1022×2780	
P08	Arka cephe	düz panel	1022×2780	
P09	Arka cephe	düz panel	1022×2780	
P10	Arka cephe	düz panel	1022×2780	
KM4	Köşe	kavisli KM	626×2780	iç sac 532
P11	Sol cephe	düz panel	1047×2780	
P12	Sol cephe	düz panel	1047×2780	

Toplam panel / modül yüzeyi ≈ 35.3 m² (boşluklar hariç)

Panel notları

- Panel: 60 mm PIR, dış RAL 7016, iç RAL 9010, düz yüzde dikey montaj.
- Genişlikler dış yüze göre net ölçüdür; panel üreticisinden kesimli istenir.
- P02 (pencere gözü): alt 960 ve üst 700 yüksekliğinde iki yatay parça. Alternatif: tam panel takılıp boşluk sahada kesilir (pafta 03, adım 3).
- Dikey derzler dikme üzerine gelir; derz içi bütil bant + dış lamba.
- Panel alt ucu taban çerçevesine, üst ucu üst çerçeveye vidalı.
- Köşe modülleri (KM1–KM4) pafta 05'e göre yerinde veya atölyede üretilir.
- Panel alt kotu +120, üst kotu +2900.

MHC Mola · Kiosk

5.0 × 3.0 × 3.0 m · prefabrik kahve kioskusu


Sandviç panel ve köşe modülü açınımı

Tüm ölçüler mm'dir. Ölçüler sahada kontrol edilmeden imalata başlanmaz.

PAFTA 06

ÖLÇEK 1:40

TARİH 28.10.2026

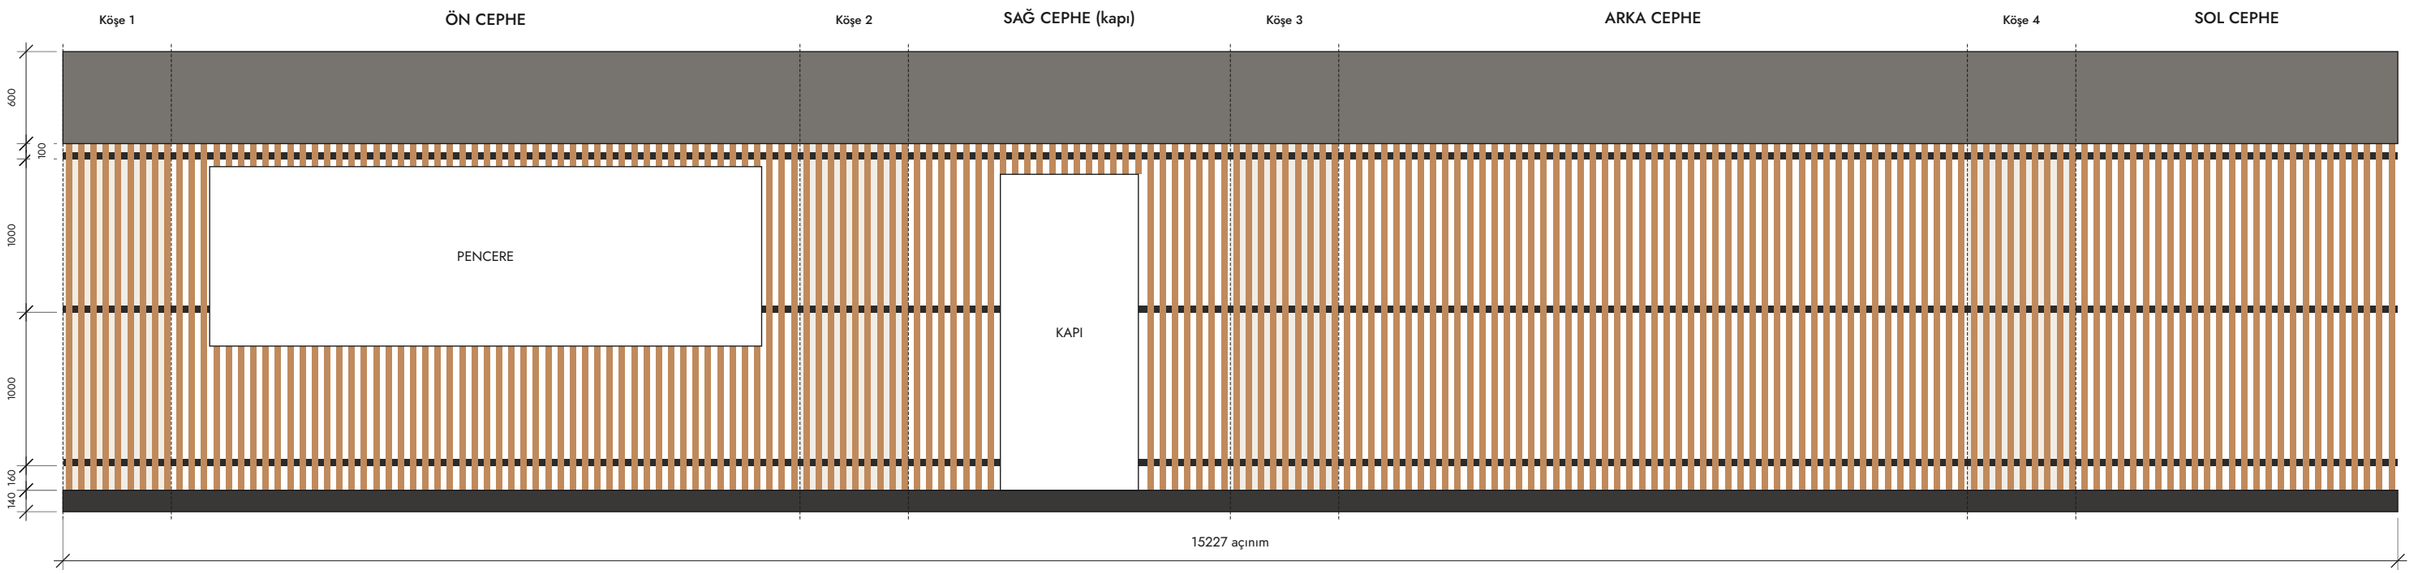

ÇITA AÇINIMI · süpürgelik, karkas, çıtalar, saçak bandı

Ölçek 1:40

Boy mm	Adet	Toplam m
2255	133	299.9
935	45	42.1
200	12	2.4
150	45	6.8

Toplam 235 parça · 351.1 m çıta (fire hariç, +%8 alın)

Karkas kotu	Parça	Boy m
+300	2	14.07
+1300	3	10.47
+2300	1	14.98

Çıta vidası A2 4,5×40: 1002 adet (+%10)

Çıta

- Kesit 40×28 mm, aks 80.1 mm, ara boşluk 40 mm.
- Malzeme: termo dişbudak / termo çam (ceviz tonu yağ) veya ahşap görünümlü alüminyum. Uç kesitler ve vida delikleri yağlanır.
- Her çıta, kestiği her karkasa 2 vida ile; vida başı çıtaya gömme.
- Çıta altı +145, üstü +2400 (saçak altı); boşluk altı ve üstünde kısa parçalar.
- Dizilim ön-sol köşe teğetinden başlar (Ç001) ve saat yönü tersine ilerler.

Karkas

- 45×22 siyah eloksal Ω profil, panele 2 vida / 600 mm.
- Köşelerde hadde bükümlü veya 100 mm'lik kısa parçalarla.
- Boşluk kenarlarında karkas 2 mm geride biter.

MHC Mola · Kiosk

5.0 × 3.0 × 3.0 m · prefabrik kahve kioskusu


Çıta ve karkas açınımı

Tüm ölçüler mm'dir. Ölçüler sahada kontrol edilmeden imalata başlanmaz.

PAFTA 07

ÖLÇEK 1:40

TARİH 28.10.2026



SAÇAK KASETLERİ AÇINIMI · görünen yüz ölçüleri, derz 8 mm, ön-sol köşeden

Ölçek 1:40

No	Cephe	Tip	Görünen G × Y	Açınım (kıvrım dahil)
K01	Köşe	R468 kavisli	727 × 600	787 × 660
K02	Ön cephe	düz	1017 × 600	1077 × 660
K03	Ön cephe	düz	1017 × 600	1077 × 660
K04	Ön cephe	düz	1017 × 600	1077 × 660
K05	Ön cephe	düz	1017 × 600	1077 × 660
K06	Köşe	R468 kavisli	727 × 600	787 × 660
K07	Sağ cephe (kapı)	düz	1042 × 600	1102 × 660
K08	Sağ cephe (kapı)	düz	1042 × 600	1102 × 660
K09	Köşe	R468 kavisli	727 × 600	787 × 660
K10	Arka cephe	düz	1017 × 600	1077 × 660
K11	Arka cephe	düz	1017 × 600	1077 × 660
K12	Arka cephe	düz	1017 × 600	1077 × 660
K13	Arka cephe	düz	1017 × 600	1077 × 660
K14	Köşe	R468 kavisli	727 × 600	787 × 660
K15	Sol cephe	düz	1042 × 600	1102 × 660
K16	Sol cephe	düz	1042 × 600	1102 × 660


Kaset levha ihtiyacı ≈ 10.7 m² (fire hariç)

Diğer Alucobond parçaları

Parça	Ölçü	Not
Süpürgelik h140, çevre	15.27 m	köşeler kavisli
Parapet kapağı, çevre	15.08 m	genişlik 92 + 2 damlalık
Pencere sövesi yan ×2	128 × 1170	
Pencere sövesi üst / denizlik	128 / 158 × 3600	denizlik 3° eğimli
Kapı sövesi yan ×2 + üst	128 × 2060 / 900	
Kapı kanadı kaplaması ×2 yüz	850 × 2020	çelik kasa üzerine
Pencere saçağı (LED'li)	3680 × 160	alt yüzde LED kanalı
Kanal harf logo, ön	2054 × 460	40 derinlik, arkadan LED
Kanal harf logo, sol yan	1339 × 300	40 derinlik, arkadan LED
Daire çıkma tabela, çift taraflı	Ø720 × 60	kenarı ışıklı

Kaset imalatı

- 4 mm Alucobond (mat siyah), CNC V-freze + bükme, köşeler perçinli.
- Kavisli kasetler (K01, K06, K09, K14) hadde ile R468 bükülür, üst/alt dönüşler bükümden sonra parçalı kıvrılır.
- Kasetler pimli askı sistemiyle asılır; vida görünmez.
- Saçak yüzü çıta yüzünden 18 mm dışarıda.

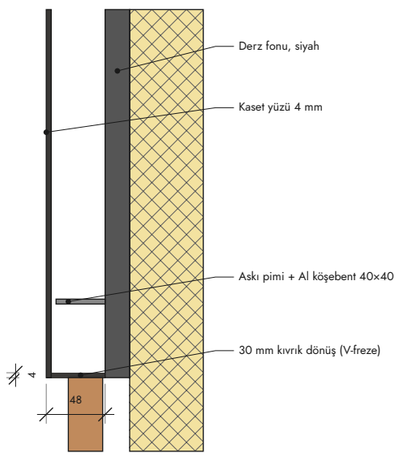

KASET ALT KENAR DETAYI

Ölçek 1:5

MHC Mola · Kiosk

5.0 × 3.0 × 3.0 m · prefabrik kahve kioskusu


Alucobond kaset, süpürgelik ve kaplamalar

Tüm ölçüler mm'dir. Ölçüler sahada kontrol edilmeden imalata başlanmaz.

PAFTA 08

ÖLÇEK 1:40 · 1:5

TARİH 28.10.2026

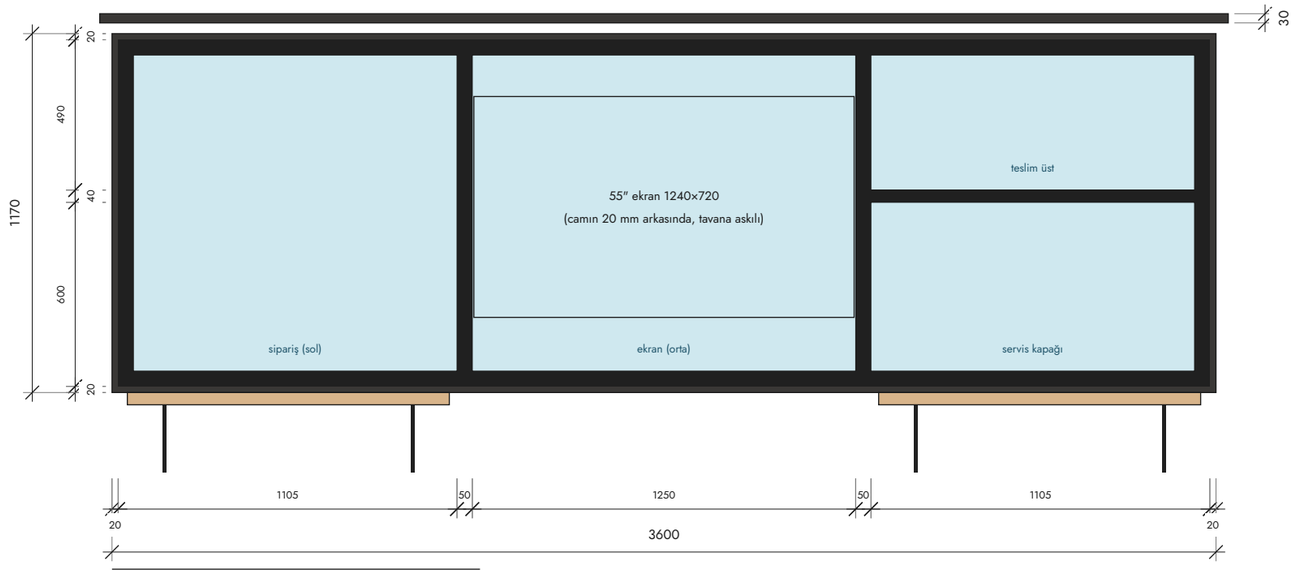

PENCERE GÖRÜNÜŞÜ (dıştan) · sipariş / ekran / teslim gözleri


Ölçek 1:20

Cam	Kesim ölçüsü	Tip
sipariş (sol)	1075 × 1050	6 mm temperli
ekran (orta)	1270 × 1050	6 mm temperli
teslim üst	1075 × 460	6 mm temperli
servis kapağı	1075 × 570	6 mm temperli · dikey sürgülü

Doğrama profili	Ölçü
sol	50 × 1130
sağ	50 × 1130
üst	3560 × 50
alt	3560 × 50
kayıt 1	50 × 1130
kayıt 2	50 × 1130
sürgü kaydı	1130 × 40

Doğrama

- Siyah RAL 9005 alüminyum, profil yüzü 50 mm, cam payı 10 mm.
- Servis kapağı: alt sağ göz, ray içinde 500 mm yukarı kayar, gazlı amortisörle dengeli; kapalıyken kilitli.
- Denizlik: Alucobond, bar rafı ile aynı kotta +1080 (iç tezgâh hizası).
- Bar rafı: 40 mm masif meşe, 300 mm, siyah çelik konsol @ 600.
- Pencere saçağı alt yüzünde 3000 K LED şerit, IP65.

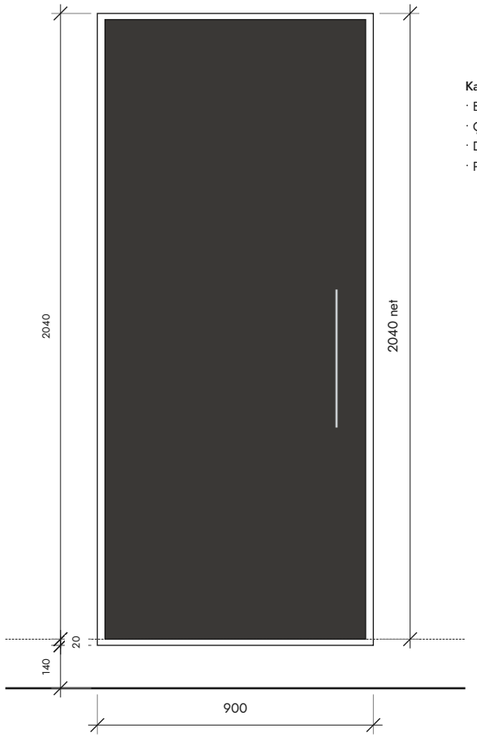

Kapı

- Boşluk 900 × 2060, net geçiş 850 × 2040.
- Çelik kasa + 40 mm yalıtımlı kanat, iki yüz Alucobond kaplı.
- Dışa açılır, 3 menteşe, kapı kapatıcı, silindirli kilit.
- Paslanmaz çekme kol 450 mm; eşik +160 bitmiş döşeme.

KAPI GÖRÜNÜŞÜ (dıştan)

Ölçek 1:20

MHC Mola · Kiosk

5.0 × 3.0 × 3.0 m · prefabrik kahve kioskusu


Pencere, servis kapağı, ekran ve kapı

Tüm ölçüler mm'dir. Ölçüler sahada kontrol edilmeden imalata başlanmaz.

PAFTA 09


ÖLÇEK 1:20

TARİH 28.10.2026

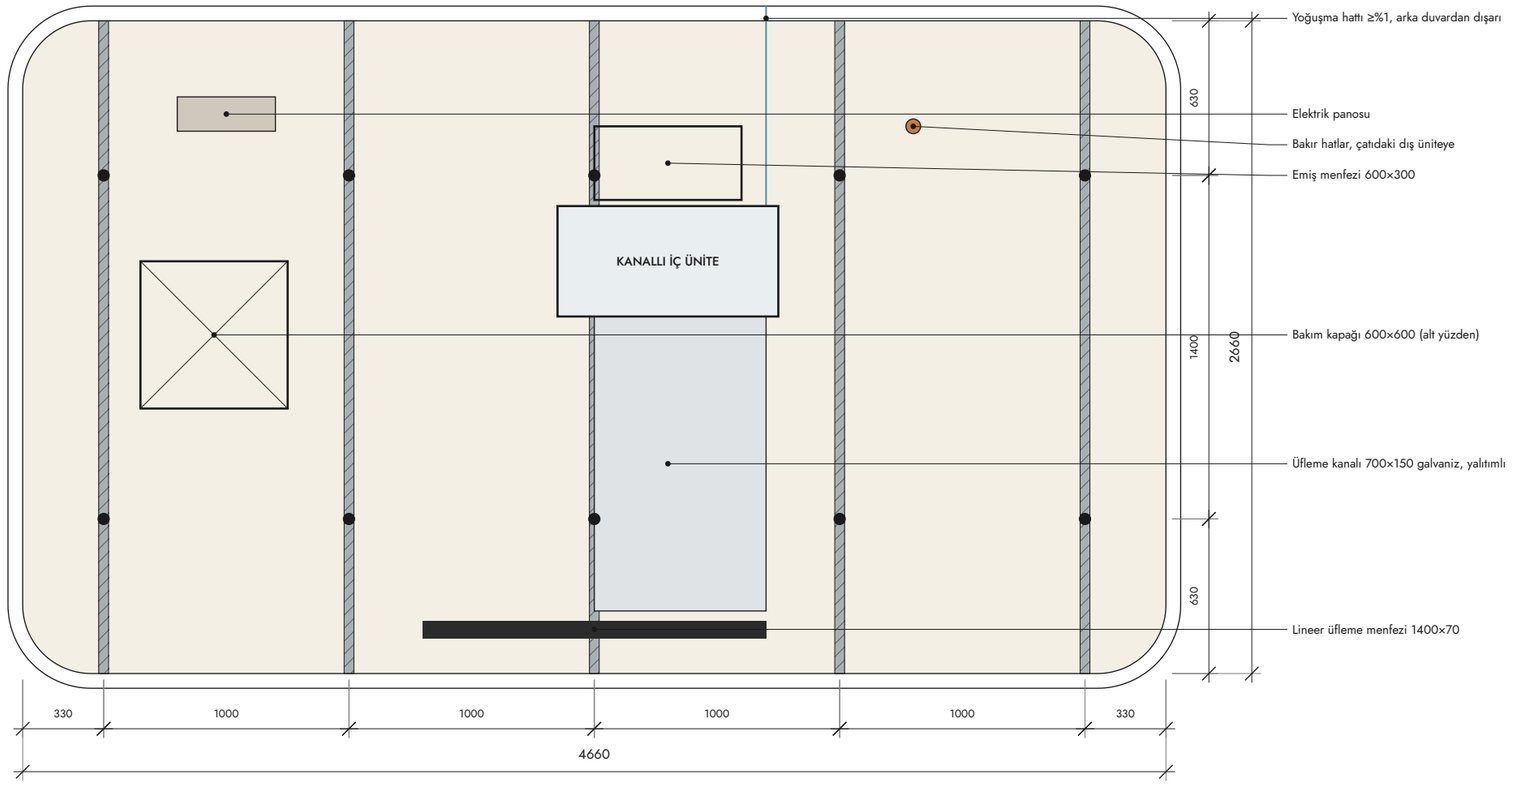

ASMA KAT PLANI (+2564 üstünden bakış)

Ölçek 1:25

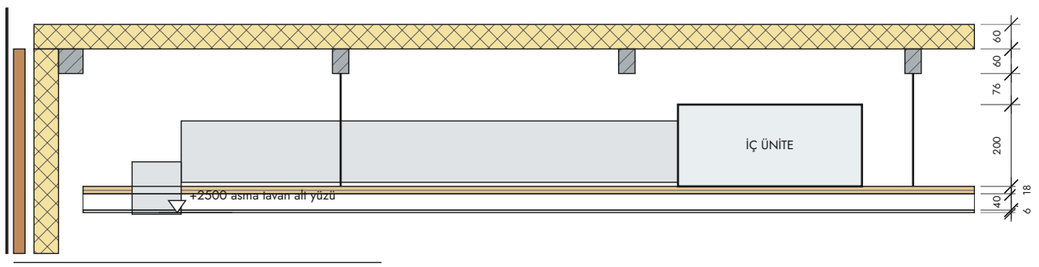

KESİT (kısmi) · ünite ve üfleme kanalı

Ölçek 1:15

Asma kat

- Alt yüz +2500: 6 mm beyaz kompozit panel (sökülebilir).
- 40×40×2 taşıyıcılar 1000 aks, her biri 2 M10 askı ile aşıklara; duvar kenarında L40×40×4 çevre köşebendine oturur.
- Üstte 18 mm kontrplak servis zemini; taşıma ≤ 100 kg/m² (yalnız servis).

Klima

- Gizli kanallı (slim ducted) iç ünite, h ≤ 200 mm, 9.000–12.000 BTU/h.
- Üfleme: pencere üstü lineer menfez (müşteri önü + tezgâh).
- Emiş: arka tarafta 600×300 menfez, filtreli.
- Dış ünite çatıda, titreşim takozlu; bakır hatlar izoleli.
- Yoğuşma ≥%1 eğimle arka duvardan süpürgelik altına.
- Bakım kapağı ünite servis tarafına 600 mm yakınlıkta.

MHC Mola · Kiosk

5.0 × 3.0 × 3.0 m · prefabrik kahve kioskusu


Teknik asma kat ve klima yerleşimi

Tüm ölçüler mm'dir. Ölçüler sahada kontrol edilmeden imalata başlanmaz.

PAFTA
10

ÖLÇEK
1:25 · 1:15


TARİH
28.10.2026

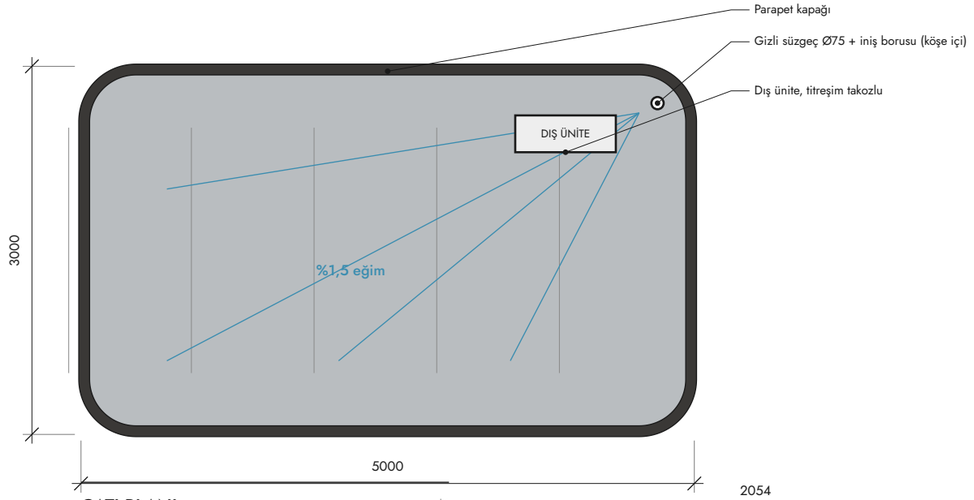


ÇATI PLANI
Ölçek 1:50



ÖN BANT LOGOSU · kanal harf, ortada
Ölçek 1:20

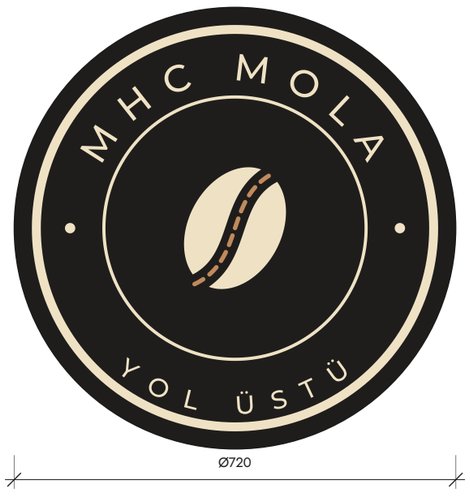

DAİRE ÇIKMA TABELA · önden ve yandan
Ölçek 1:10

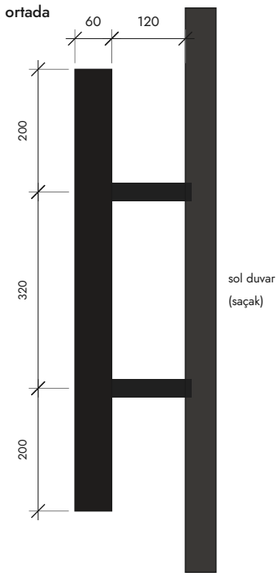

Toplam metraj (fire hariç)

Kalem	Miktar	Birim
Çelik 120×120×4	14.5	m
Çelik 100×50×3	13.3	m
Çelik 60×60×3	57.9	m
Çelik 60×100×3	8.1	m
Çelik 40×20×2 (bükümlü)	4.1	m
Çelik 60×40×2	14.0	m
Çelik 40×40×2 + L40	27.5	m
Kontrplak 2×15 mm (döşeme)	13.2	m²
Sandviç panel 60 mm (duvar)	28.3	m²
Köşe modülü KM (4 adet)	7.0	m²
Sandviç panel 60 mm (çatı)	14.1	m²
Çıta 40×28	351	m
Ω karkas 45×22	39.5	m
Alucobond kaset levhası	10.7	m²
Süpürgelik + parapet kapağı	30.3	m
Temperli cam 6 mm	3.57	m²
Asma kat kontrplak 18 mm + beyaz panel	12.3	m² ×2
Kanallı klima (iç + dış ünite)	1	takım

Logo (MHC Mola) ve tabela

- Ön bant: rozet + MHC MOLA kanal harf 2054 × 460, ortada, krem; yol çizgisi ve YOL ÜSTÜ ceviz tonu. Derinlik 40, kasetten 15 mm önde, arkadan LED.
- Sol yan bant: aynı logo 1339 × 300.
- Daire tabela: Ø720, kalınlık 60, çift taraflı rozet, kenarı ışıklı; sol duvardan 120 mm dışarıda, ön köşeye 800 mm, merkez +2620.
- Konsol: 2 adet 30×12 siyah lama, saçak arkasındaki dikmeye cıvatalı.
- Logo dosyaları: kiosk/art/logo (SVG / PNG).

MHC Mola · Kiosk
5.0 × 3.0 × 3.0 m · prefabrik kahve kioskusu

Çatı, logo, daire tabela ve toplam metraj

Tüm ölçüler mm'dir. Ölçüler sahada kontrol edilmeden imalata başlanmaz.

PAFTA 11
ÖLÇEK 1:50 · 1:20 · 1:10
TARİH 28.10.2026
